



RENDICIÓN DE CUENTAS, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.

MEJORAS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Con la ejecución de los proyectos planteados a 2020 se ha logrado los siguientes avances:

Se cuenta con un Caudal Medio Diario (Qmd) de 88.3 lps, por lo que se incrementó en un 103,9%.

Una vez terminada las obras en ejecución se proyecta tener una disponibilidad de caudal medio diario de 110 lps, lo que representa un incremento del 154,1%.

- **INTERCONEXIÓN CONTINGENTE Y ALTERNATIVA DE SUMINISTRO CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ. S.A. E.S.P.**

Mediante gestión entre la Administración Central del Municipio de Cota y Emsercota S.A. E.S.P., se logró la conexión para suministro de agua al Sector de la Vereda Parcelas durante la vigencia 2018, la cual a la fecha tiene la capacidad de realizar el suministro de 7 Litros/Segundo a la comunidad de la Vereda, este caudal obtenido tiene la fortaleza de redundar (mayor caudal a distribuir en el acueducto) mejorando las condiciones hidráulicas de todo el sistema, para esto Emsercota S.A. E.S.P. diseño y construyó una estación de bombeo en el sector del CAI de Parcelas.

- **INTERCONEXIÓN CON EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**

Para beneficio de la comunidad Cotense, el Municipio de Cota y EMSERCOTA S.A. E.S.P., han unido esfuerzos para garantizar el suministro de agua potable durante los siguientes 25 años, en virtud de lo cual suscribió el Convenio No. 917 de 2018 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA". Con base en ello se adelantó el contrato de consultoría para realizar los diseños definitivos en fase III del proyecto de interconexión con el Acueducto de Bogotá. Contrato de Consultoría No. 040 de 2019.

De acuerdo con esté Convenio Emsercota S.A. E.S.P. retomó las gestiones ante el

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co



Acueducto de Bogotá, con la cual se concluyó que durante el 2019 y 2020 se podría ejecutar una primera etapa de la interconexión con la Empresa Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S.P.

Con Aguas de la Sabana de Bogotá SA ESP se obtuvo una viabilidad para un caudal total de 60 litros/segundo adicionales, cuyo punto de acceso fue definido en la ribera sur del Rio Chicú, en inmediaciones del Colegio Parcelas, Vereda de parcelas. Esta viabilidad fue finalmente contratada entre las partes el 05 de noviembre de 2019, siguiendo lo estipulado en la Resolución CRA 759 de 2019.

Para Emsercota S.A. obtener dicho caudal, es necesario realizar una inversión adicional en los subsistemas de Aguas de la Sabana de Bogotá SA ESP por valor de \$ 5.000.600.000, la cual será financiada por ambas partes.

Así mismo, Emsercota S.A. E.S.P. contrató las obras de interconexión (Costos de Conexión) que comprenden: La res matriz desde el punto de acceso hasta la PTAP Parcelas en Φ 24", estación de bombeo, tubería de impulsión en Φ 18", tanque de almacenamiento y tubería de distribución en Φ 12" que una la interconexión con la infraestructura existente.

Componente	Valor Contrato Asociado
Contrato de Consultoría y Diseños	\$690,778,694.00
Contrato de Obra Civil	\$5,547,381,274.00
Contrato de Interventoría	\$383,796,583.00
Valor Total	\$6,621,956,551.00

Los avances de las obras de Interconexión con Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S.P. Etapa I son los siguientes:

Teniendo en cuenta la situación de Pandemia, el contratista se vio obligado a tomar las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19, según las directrices de las autoridades competentes en nuestro país. Presento Protocolo de bioseguridad para trabajar el cual fue avalado por el profesional competente de EMSERCOTA y presentado ante la secretaria de salud del municipio, para seguimiento y control.

Conforme a la ejecución de las actividades desde la firma del acta de inicio hasta la fecha de empalme, se establece el avance del contrato y se resume de la siguiente manera:



**EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

ITEM	CAPITULO	% CUMPLIMIENTO
1.0	Redes de Acueducto Etapa I	31.57%
2.0	Tanque de Almacenamiento	2.74%
3.0	Estación de Bombeo – Etapa I	4.08%
4.0	Línea de Impulsión	2.18%
	Avance General del Contrato	40.57%

Tabla 1 Avance general del contrato

A la fecha del empalme, el avance logrado hasta el mes de junio, se estima alrededor del 51%.

En cuanto avance del convenio 917 de 2018, se muestra en el siguiente, del cual se puede concluir el porcentaje de ejecución global es de aproximadamente del 40.86%, con un valor de amortización del anticipo cercano al 39.55%.

Componente	Valor Contrato Asociado	Valor Anticipo	Valor ejecutado	Valor Amortizado	Valor por facturar	Valor por amortizar
Contrato de Consultoría y Diseños	\$690,778,694	\$375,221,478	\$315,557,216	\$126,222,887	\$375,221,478	\$248,998,591
Contrato de Obra Civil	\$5,547,381,274	\$2,773,690,637	\$2,234,231,564	\$1,117,115,782	\$3,313,149,710	\$1,656,574,855
Contrato de Interventoría	\$383,796,583	\$191,898,292	\$155,705,309	\$77,852,655	\$228,091,274	\$114,045,637
Valor Total	\$6,621,956,551	\$3,340,810,406	\$2,705,494,090	\$1,321,191,323	\$3,916,462,461	\$2,019,619,083

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co





Con la suscripción del Convenio No. 917 de 2018 cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA**”. EMSERCOTA S.A. E.SP., realizó negociaciones con los Urbanizadores del Sector, llegando a un acuerdo con algunos de ellos como son: AMARILO SAS (Proyecto Ponteaverdi) e HITOS URBANOS SA (Proyecto El Limón), con los cuales se suscribieron Contratos de Condiciones Especiales, en los cuales estos se comprometen a realizar inversiones en el Municipio que benefician de manera directa los Servicio de Acueducto y Alcantarillado para toda la población de Cota.

☐ **CONTRATO DE CONDICIONES ESPECIALES 001 DE 2020**

En este contrato de condiciones especiales suscrito con HITOS URBANOS S.A., se definieron obras de la Red Distribución de Acueducto y de la Red secundaria de Parcelas hasta la PTAR de ROZO por valor de \$ 1.705 millones.

Las cuales se desglosan a continuación:

- ☐ Red de Distribución en PVC diámetro 12”.
- ☐ Red de Alcantarillado de Parcelas Diámetro.
- ☐ Estación de Bombeo Parcelas

☐ **PLATAFORMA TECNOLÓGICA EMSERCOTA**

Emsercota S.A. E.S.P. adelanta la construcción e implementación de una moderna plataforma tecnológica basada en el Internet de las Cosas (IOT), que es el concepto basado en la interconexión de internet de cualquier producto con otros de su alrededor. El objetivo es hacer que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y por consiguiente serán más inteligentes e independientes.

Para esto se seleccionó una red de área amplia de baja potencia utilizadas para uso de IOT (LPWAN) que se encuentra en el mercado Internacional y en Colombia con cobertura en Cota como es SIGFOX.

SIGFOX es un protocolo de comunicación y una solución de conectividad celular mundial para comunicaciones de baja velocidad que permite reducir los precios de conectividad y el consumo de energía para los dispositivos consultados.

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co



Bajo esta plataforma se tendrá:

- Software en ambiente WEB de servicios públicos domiciliarios
- Centro de control y monitoreo
- Automatización de plantas, pozos, tanques y bombeos.
- Procesos de facturación en tiempo real con lectura remota.
- Programa de Mínimo Vital.

- **PROGRAMA DE MÍNIMO VITAL**

El Mínimo Vital es el beneficio de agua potable y saneamiento básico al que podremos acceder en caso de que nos encontremos en un estado de vulnerabilidad; Esto fue reglamentado bajo el **Decreto N° 115** del 22 de noviembre de 2018 de la Alcaldía Municipal ***“POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”***.

- **PLAN MASIVO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.**

Emsercota S.A. E.S.P. contrato el Plan Masivo de Instalación de Conexiones Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con la Unión Temporal Medidores Cota 2019 HCC, por medio de esta se adelantará la instalación de acometidas de acueducto, instalación de medidores con telemetría e instalación del dispositivo para garantizar el Mínimo Vital.

En cuanto a alcantarillado se adelantarán las conexiones domiciliarias en aquellos sectores que adolecen de esta. Y así mismo se hará entrega de contenedores internos para la separación en la fuente de residuos sólidos y se construirá un plan piloto de contenedores soterrados.

Este programa cumple con lo estipulado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 15 del 30 de agosto de 2018 que beneficia a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Cota, lo cual no tendrá costo alguno para estos usuarios.

El programa inicia con la ejecución de una encuesta en cada vivienda que nos permitirán mejorar los servicios a cargo de nuestra empresa.

Lo avances presentados a la fecha del empalme son los siguientes:

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co



**EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	Porcentaje de avance al total de la actividad	Porcentaje de la actividad respecto al Valor Total del Contrato	% Cumplimiento
1	ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ACUEDUCTO	\$ 6,149,838,065.85	\$ 1,715,318,993.26	27.89%	70.36%	19.62%
2.0	ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ALCANTARILLADO	\$ 997,029,624.62	\$ 834,495,564.38	83.70%	11.41%	9.55%
3.0	ACOMETIDAS DE ASEO SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ASEO	\$ 1,594,129,684.98	\$ 1,364,012,023.19	85.56%	18.24%	15.60%
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 8,740,997,375.45	\$ 3,913,826,580.84	44.78%		44.78%

- Instalación masiva de conexiones domiciliarias de acueducto
- Instalación masiva de conexiones domiciliarias de alcantarillado
- Entrega de contenedores para separación en la fuente
- Contenedores soterrados

MEJORAS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

- PTAR PUEBLO VIEJO

Actualmente se encuentra en una ejecución superior del 95% de las obras civiles, en proceso de montaje de equipamiento y energización del proyecto, esperando iniciar la etapa de puesta en marcha en el primer semestre del 2020. El contrato presenta un avance general de 75%.

Es importante aclarar que este proyecto cuenta con los permisos requeridos y en trámite el de vertimiento en la Corporación Autónoma Regional CAR.

Avances del Proyecto:

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca
Teléfono: 8641425 - 8777148
Emergencias: 320 8377877
NIT: 900.124.654-4
pqr@emsercota.gov.co





EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

DESCRIPCION	OBRA	% INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
VALOR CONTRATOS	\$ 17.022.347.356,00	0,069	\$ 1.173.678.746,00	
ACTA No 7				
DESCRIPCION	OBRA		INTERVENTORIA	
	ACTAS PAGAS ANTERIORES	ACTAS PAGAS PRESENTE ACTA	ACTAS PAGAS ANTERIORES	ACTAS PAGAS PRESENTE ACTA
acta 1	\$ 186.397.396,00		\$ 72.005.827,10	
acta 2	\$ 1.110.056.786,00		\$ 72.005.827,10	
acta 3	\$ 3.710.754.316,00		\$ 72.005.827,10	
acta 4	\$ 2.335.404.089,00		\$ 72.005.827,10	
acta 5	\$ 1.107.041.848,00		\$ 294.590.821,11	
acta 6	\$ 685.832.542,00		\$ 129.209.248,00	
acta 7	\$ 1.193.334.290,00			
acta 8	\$ 1.005.689.399,00			
acta 9	\$ 1.099.070.065,00		\$ 145.121.668,47	
adicion 02	\$ 674.427.493,00		\$ 46.461.444,00	
acta 10 en tramite	\$ 203.356.413,00			\$ 14.037.383,74
TOTALES	\$ 12.636.937.144,00			
TOTAL PAGADO		\$ 12.433.580.731,00	\$ 856.945.045,98	
SALDO POR EJECUTAR		\$ 5.059.837.705,00		\$ 349.157.760,28

Por
AMOR
a
COTA
Si Podemos

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca
Teléfono: 8641425 - 8777148
Emergencias: 320 8377877
NIT: 900.124.654-4
pqr@emsercota.gov.co





MEJORAS EN EL SERVICIO DE ASEO

- **COMPACTADORES NUEVOS**

Los compactadores, modelo 2019, que refuerzan la flota existente, cumplen con las normas internacionales sobre emisión de partículas contaminantes y ahorro de combustible, esto para fortalecer las rutas de residuos ordinarios

- **PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS).**

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se ha venido ejecutando mediante convenios interadministrativos entre la alcaldía municipal y la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., durante los últimos cuatro años se logró sembrar la cultura de separar en la fuente los residuos mediante capacitaciones y jornadas de educación ambiental a todo tipo de población escolar, residencial, comercial, industrial e institucional

Logrando así implementar dos rutas selectivas junto con la población recuperadora de oficio para la recolección de residuos orgánicos y reciclables al 100% del área urbana y 80% del área rural,

Así mismo se implementaron programas para el manejo adecuado de residuos especiales (medicamentos, llantas, electrodomésticos, pilas, colchones) disminuyendo en un 10% la disposición en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo y garantizando la disposición y manejo adecuado para cada tipo de residuo.

Por otra parte, se realiza apoyo a toda la población recuperadora mediante la inclusión social censando a los recuperadores de oficio para un total de 23 recuperadores que pertenecen a la asociación de recuperadores de Cota ARECOTA. Así mismo se conformó el comité de conciliación y se han realizado los correspondientes con la Asociación Arecota y Asoreciklar E.S.P. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Punto Calidad de Vida.

Se identifican las bodegas, centros de acopio, plantas y demás instalaciones que realicen actividades de aprovechamiento y comercialización de residuos aprovechables, para llevar el control y seguimiento a la actividad de aprovechamiento en el municipio.

Se realizó seguimiento y trazado, a cada una de las rutas de barrido de la Empresa de Servicios Públicos con el fin de verificar: Tiempos programados y cumplimiento real de tiempos, Frecuencias establecidas y cumplimiento de frecuencias por ruta, Coberturas programada y Cumplimiento por parte del Operario, Posibles modificaciones a rutas, Calificación de desempeño por operario.

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 320 8377877

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co



SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, así:

A. Recursos Financieros:

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 1 de enero y 31 de Mayo	
Activo Total	\$ 19.883
Corriente	\$ 8.754
No Corriente	\$ 11.129
Pasivo Total	\$ 18.343
Corriente	\$ 18.343
No Corriente	\$ 0
Patrimonio	\$ 1.539

La Resolución 182 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002", establece la preparación y publicación de informes financieros y contables mensuales, por lo que a continuación, se presenta el detalle de revelaciones correspondiente al mes de mayo de 2020.

las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

Cabe resaltar que la pérdida acumulada a mayo corresponde a la ejecución del contrato 109 de 2019 suscrito con la Unión Temporal Medidores Cota 2019 HCC para conexiones domiciliarias del servicio de aseo acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal, pero estas mismas conexiones aún no han sido facturadas a cada uno de los usuarios para la posterior aplicación del subsidio por parte del Municipio de Cota.

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 1 de enero y 31 de Mayo	
Ingresos Operacionales	\$ 2.203,7
Gastos Operacionales	\$ 512,4
Costos de Venta y Operación	\$ 5.001,3
Resultado Operacional	-\$ 3.310,0
Ingresos Extraordinarios	\$ 16,4
Gastos Extraordinarios	\$ 0,1
Resultado No Operacional	\$ 16,2
Resultado Neto	-\$ 3.293,8

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co



B. Bienes Muebles e Inmuebles

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 1 de enero y 31 de Mayo	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 70
Construcciones en curso	\$ 0
Maquinaria y equipo	\$ 328
Equipo médico y científico	\$ 11
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 0
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 22
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 6
Bienes muebles en bodega	\$ 15
Redes, líneas y cables	\$ 24
Plantas, ductos y túneles	\$ 0
Otros Conceptos	\$ 0


Nota: en el informe final se presentará a corte 30 de noviembre de 2020.

PLANTA DE PERSONAL:


CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS EN LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
Número de cargos	6	2	3
Cargos Trabajadores Oficiales			
Número de cargos	35	35	0


Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca
Teléfono: 8641425 - 8777148
Emergencias: 320 8377877
NIT: 900.124.654-4
pqr@emsercota.gov.co



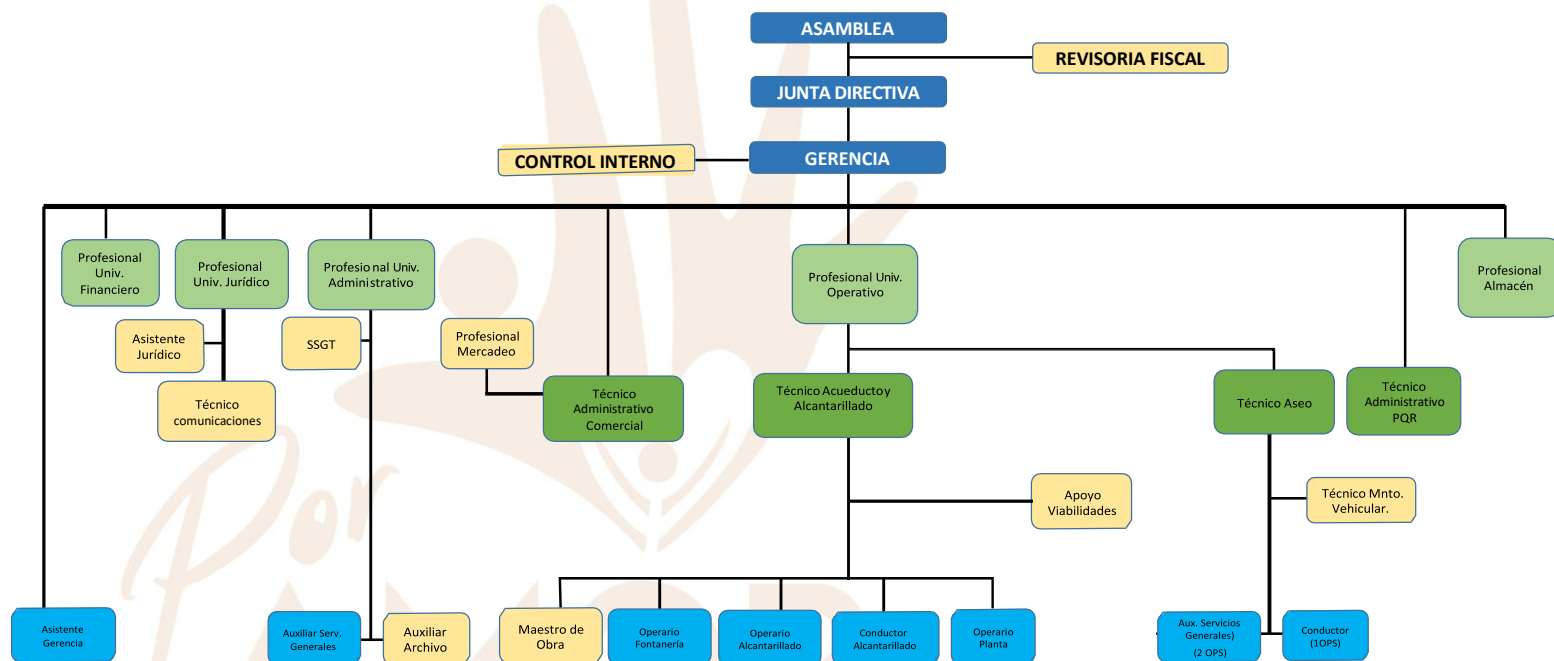

Planta de Personal Inicial encontrada:

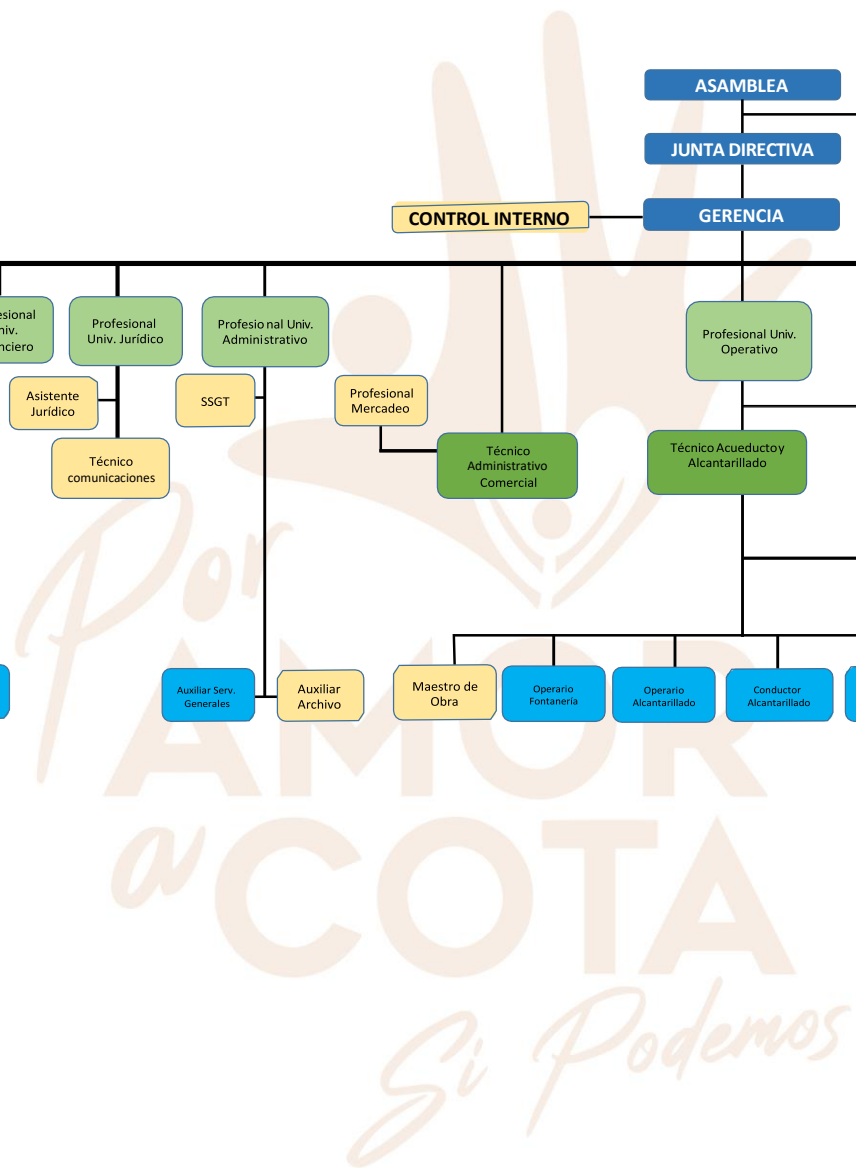

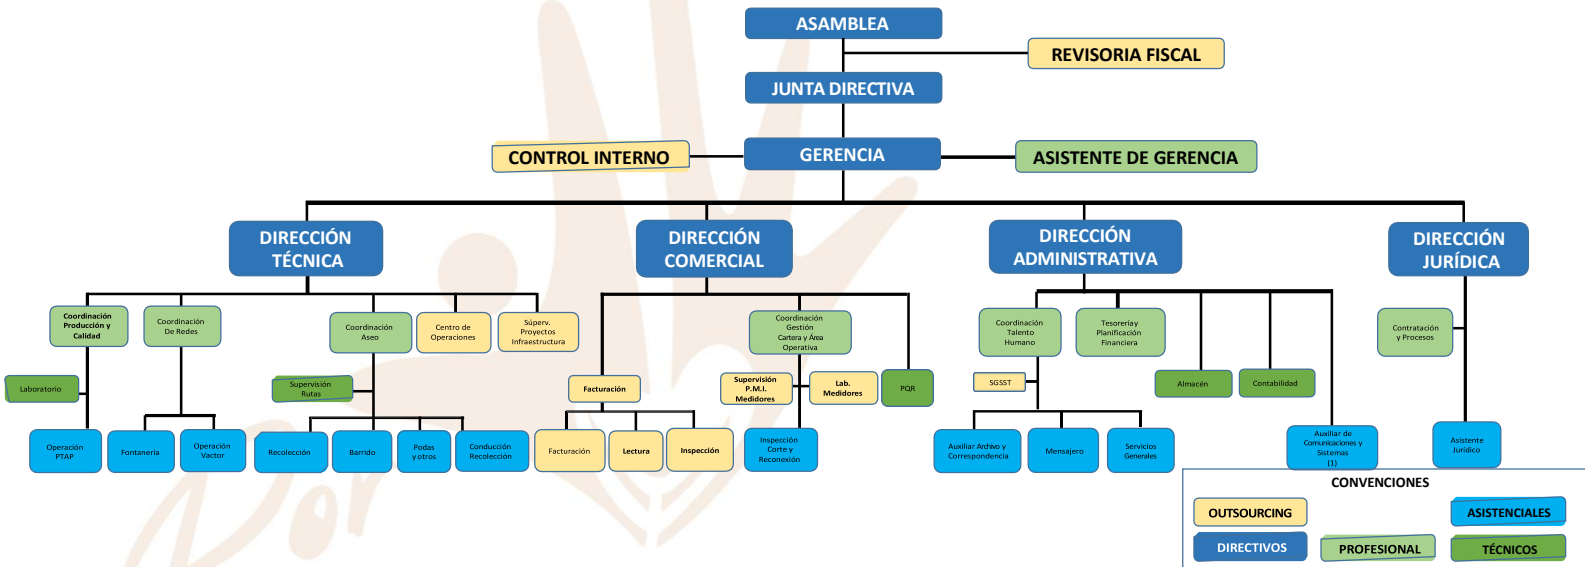

Planta de Personal aprobada en Junta Directiva No. 12 de Octubre 25 de 2019:
En la actualidad se está adoptando de manera escalonada.

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Se relacionan cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 1 de enero y 30 de Junio				
Contrato No. 103-2020	PLATAFORMA TECNOLÓGICA		X	\$ 1.088

OBRAS PÚBLICAS

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales anteriores y de las cuales aún se encuentra en ejecución, el valor incluye adiciones o modificaciones.

OBJETO DE LA OBRA PUBLICA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)	OBSERVACIONE
			EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 1 de enero y 31 de diciembre						
EJECUTAR EL PLAN MASIVO PARA LA EJEUCION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE COTA – FASE I y II	UNION TEMPORAL MEDIDORES	GRUPO INTERPROYECTOS LTDA		X	\$ 12.041,75	
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA ESP AL MUNICIPIO DE COTA PRIMERA ETAPA	CONSORCIO ALCRUZ COTA	CONSORCIO INTERCONEXION COTA - BOGOTA PRIMERA ETAPA		X	\$ 6.360,21	

EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Se relaciona los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución a 31 de mayo, la actualización a noviembre 30 se realizará en la presentación oficial.

INGRESOS			
CONCEPTO DE INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca Teléfono: 8641425 - 8777148 Emergencias: 320 8377877 NH: 990.124.834-4 pq@emsercota.gov.co			
Aportes de la Nación	\$ 30.406.853.335,00	\$ -	0%
Recursos Propios	\$ 11.322.022.811,07	\$ 11.322.022.811,07	37,61%
Otros Conceptos (Convenios)	\$ 3.992.982.232,00	\$ 343.976.032,00	8,61%

Se relaciona los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.



GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Funcionamiento	\$ 1.857.102.361,20	\$ 938.956.326,00	50,56%
Operación	\$ 19.390.088.119,00	\$ 14.326.605.187,47	73,89%
Inversión	\$ 261.954.575,00	\$ 39.000.000,00	14,89%
Otros Conceptos (Convenio	\$ 11.234.630.421,80	\$ 11.087.607.382,56	98,69%

CONTRATACIÓN:

Se relaciona el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No se incluyen los contratos de obra pública reportados en el punto antes relacionado).

CONTRATOS				
MODALIDAD DE CONTRATACION	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	0 - 80 SMMLV y Excepciones	78	23	\$ 3.210.545.343
Selección Simplificada	80 - 300 SMMLV	5	0	\$ 473.285.921
Convocatoria Privada	300 - 1000 SMMLV			
Convocatoria Pública	> 1000 SMMLV			

REGLAMENTOS Y MANUALES:

Estos son los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMOS DE ADOPCION Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION
Manual de Contratación	Estatuto de Contratación	Aprobado por Junta Directiva	ACUERDO No. 01	Julio de 2014
Manual del Urbanizador y Constructor	Viabilidades y Factibilidades de Servicio - Decreto 3050 de 2013	Aprobado por Junta Directiva	Resolución No. 053	Septiembre 24 de 2018
Manual de Funciones	Manual de Funciones de Personal de Planta	Aprobado en Junta Directiva - Restructuración		Octubre 25 de 2019
Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento Interno de Trabajo			Febrero 4 de 2011
Convención Colectiva SUNET	Vigencia 3 Años		N/A	Octubre 1 de 2016
Convención Colectiva SINTRAOFIEMPU	Vigencia 3 Años		N/A	Junio 1 de 2019

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co





EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA
EMSERCOTA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA



Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca

Teléfono: 8641425 - 8777148

Emergencias: 320 8377877

NIT: 900.124.654-4

pqr@emsercota.gov.co

